

Assunto: AQUEDUTO LOGRADOURO - 1305
ETAPAS DE CONCRETAGEM


data: 17/03/10

Anotações:

A ENGE CORPS apresenta através desta Nota de Obra redefinição das etapas de concretagem apresentadas nas notas 5, 6 e 7 do desenho 1410-DEP-1305-30-82-004 R4.

Face a estrutura em construção apresentar-se totalmente cimbrada, com dimensionamento para cargas de até $3t/m^2$, as etapas de concretagem anteriormente previstas nas citadas notas poderão ser desconsideradas, não sendo necessário, portanto, que as concretagens das paredes sejam executadas simultaneamente.

Croqui

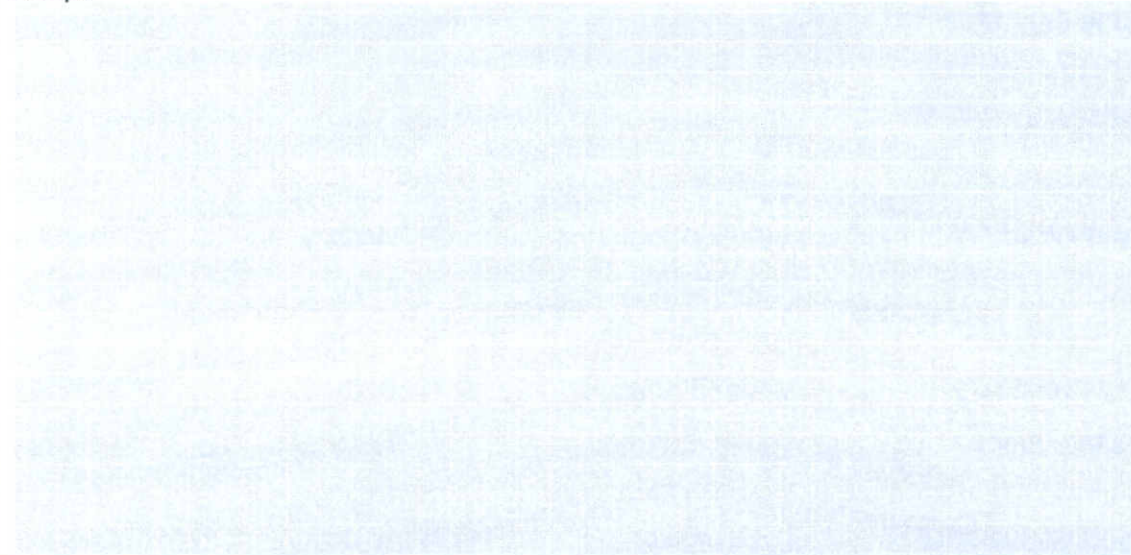

Responsável: LUÍS HONORATO F. MOURARIA

Recebido em

17/03/2010

Assinatura do Recebente

15.37h
