

Assunto: AQUEDUTOS LOGRADOURO/SACO DA SERRA
LAJE AUXILIAR PARA CONCRETAGEM

data: 07/10/09

Anotações:

A ENGEORPS, atendendo a solicitação constante do MEMO 480/2009 (CCASF), encaminhado pela Sondotécnica, efetuou a verificação da proposta em executar laje maciça de 15 cm que servirá de forma na concretagem do topo dos pilares. Sob o aspecto estrutural, a proposta apresentada poderá ser executada de acordo com o croqui anexo.

A ENGEORPS emitirá Nota Técnica sobre o assunto.

Recebido em, 07/10/09
SONDOTÉCNICA 10:00h

Assunto: AQUEDUTOS LOGRADOURO/SACO DA SERRA
LAJE AUXILIAR PARA CONCRETAGEM

data: 07/10/09


Anotações:

Croqui

ANEXO

Responsável: LUÍS HONORATO F. MOURARIA





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

CONSÓRCIO CONSTRUTOR AGUAS DO SÃO FRANCISCO – LOTE 01

PACOTE – 1410

MEMORANDO Nº 480/2009

DATA : 05/10/2009

Folha: 01/01

DE: Eng. Cássio Vittori – Gerente de Engenharia - Consórcio Construtor Águas do São Francisco

Para: Eng. Silvio Paschoalin - Coordenador de Contrato – Supervisão Lote 01

Assunto: Aqueduto Saco da Serra e Logradouro.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo o croqui com a sugestão de execução de uma laje maciça com 15 cm de espessura para servir de forma da "Cabeça do Pilar".

Gentileza consultar à Projetista, para aprovação.

Atenciosamente,


Cássio Vittori de Campos

Gerente de Engenharia




Recebido em 05/10/09
SINBOQUEENCA

12:00h
[Assinatura]

DETALHE - A

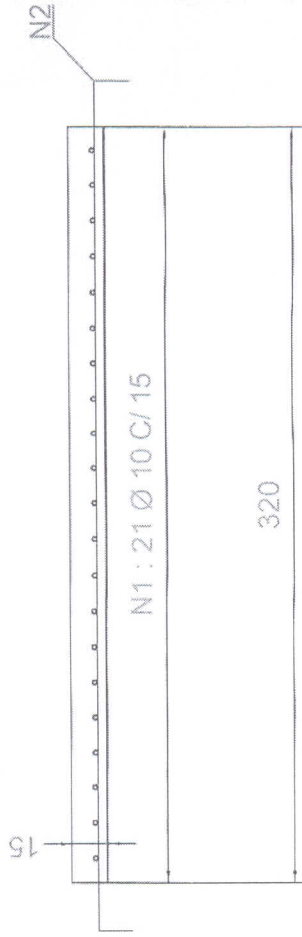

DETALHE - B

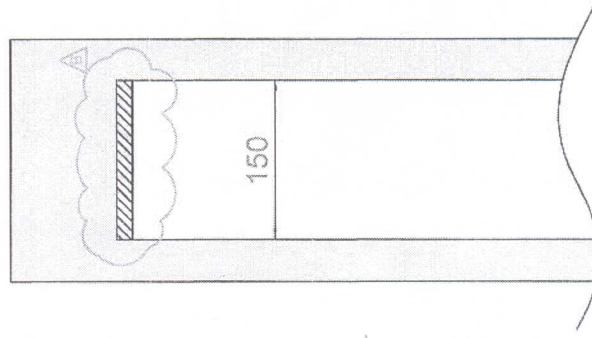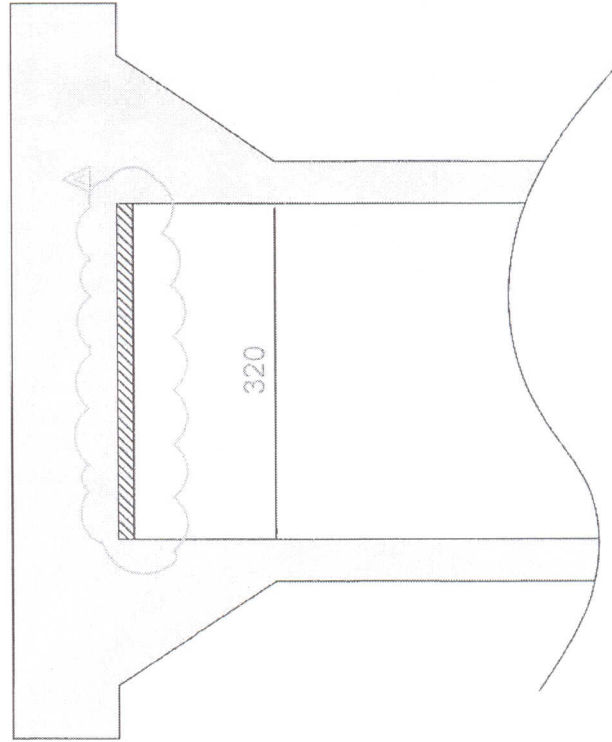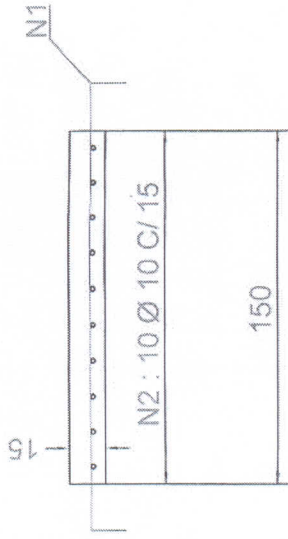

Aquedutos Saco da Serra e Logradouro

Solução construtiva para a concretagem da "cabeça do pilar" : Execução de laje de escoramento da parte maciça da "cabeça do pilar"

Nota: Dimensões em Centímetros

77
