


Anotações:

A ENGECORPS apresenta através desta Nota de Obra comentários sobre as exigências de projeto referentes à execução dos aterros de encontro do Aqueduto Terra Nova.

No desenho 1210-DEP-1308-04-02-003-R02 é citado na nota 10: "Para construção do aterro com enrocamento, a escavação na área de implantação deverá atingir o topo rochoso. A construção deverá ser feita em camadas com espessura máxima de 1,0m, compactando-se com rolo vibratório de peso maior que 9 t e as pedras deverão ser molhadas com cerca de 200 litros de água por metro cúbico de enrocamento. O número de passadas do rolo sobre cada camada não será menor que 6. No contorno do pilar deverá existir uma camada de material de transição, com espessura de 1,0m."

No caso do Aqueduto Terra Nova, conforme observação realizada "in situ", os aterros de encontro poderão ser apoiados sobre a camada de saprolito, desde que esta tenha capacidade de suporte adequada (tensão admissível mínima de 0,5 MPa) e que sejam removidas todas as camadas sobrejacentes à camada de saprolito.

Croqui

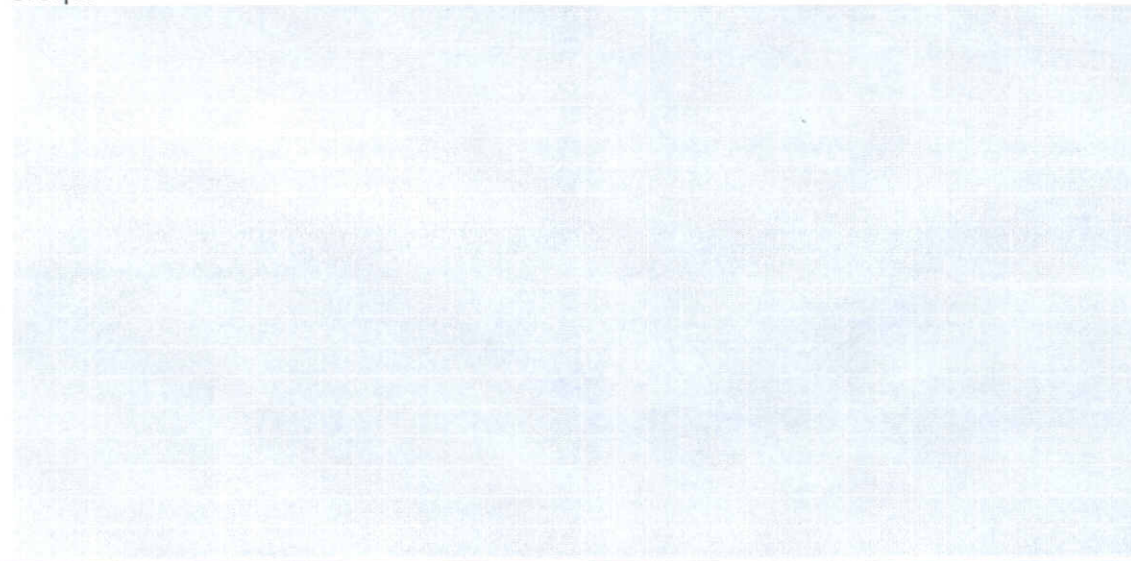

Responsável: LUÍS HONORATO F. MOURARIA

[Handwritten signature]
