

Nota de Obra - ATO

Assunto: AQUEDUTO LOGRADOURO

06

Data: 06.08.09

REATERRO DAS CAVAS DAS SAPATAS

Fl. 1 / 1

Anotações:

A ENGEORPS apresenta detalhamento para o reaterro das cavas de escavação para execução das sapatas,
tendo em vista que houve preenchimento parcial das mesmas com areia artificial.

Deverão ser obedecidas as notas e as faixas granulométricas apresentadas no desenho 1210-DEP-1305-04-02-003 R4

folhas 1 e 2.

Anexo seções típicas.


Croqui

Responsável:


LUÍS HONORATO F. MOURARIA

Recebido em 06/08/09
SONDOTÉCNICA

16:10R

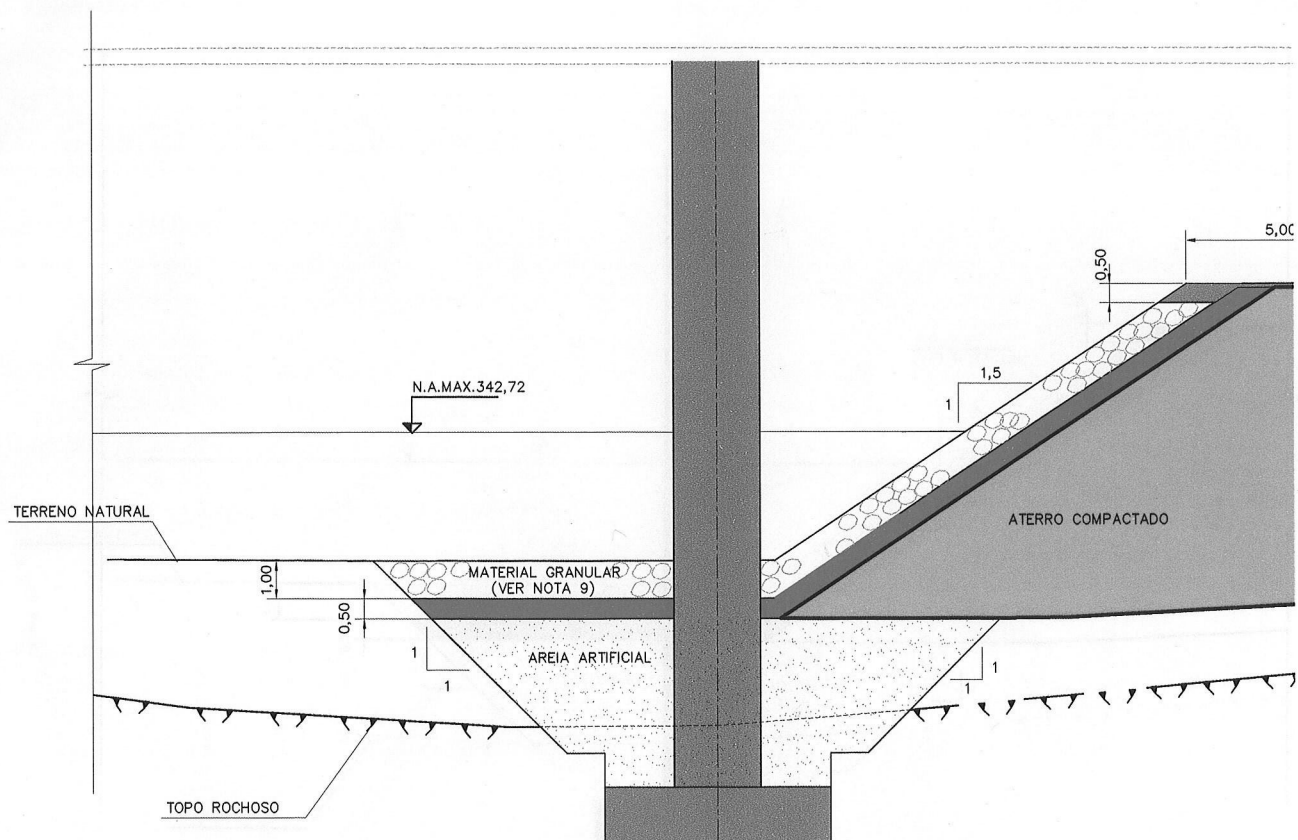



SEÇÃO TÍPICA
ESC. 1:100

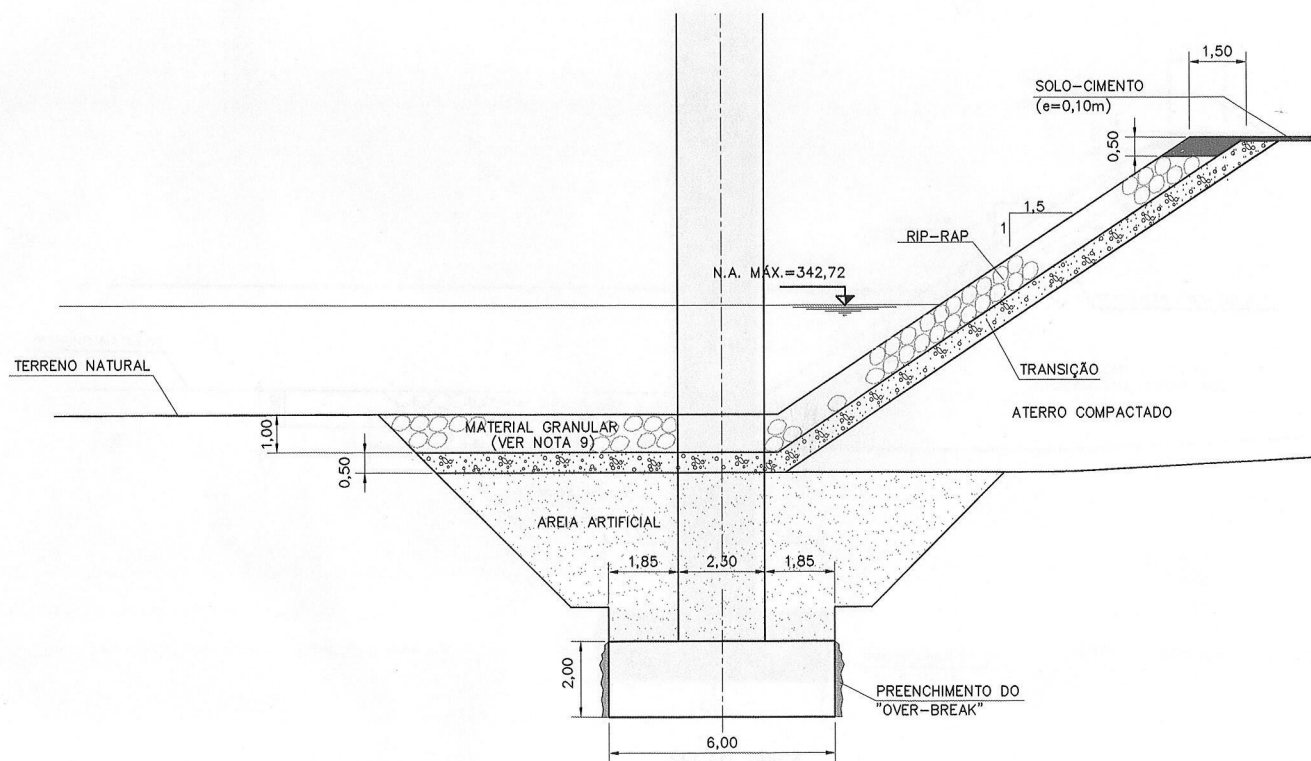

SEÇÃO TÍPICA
ESC. 1:100

Revisado
cópia anexa

pt

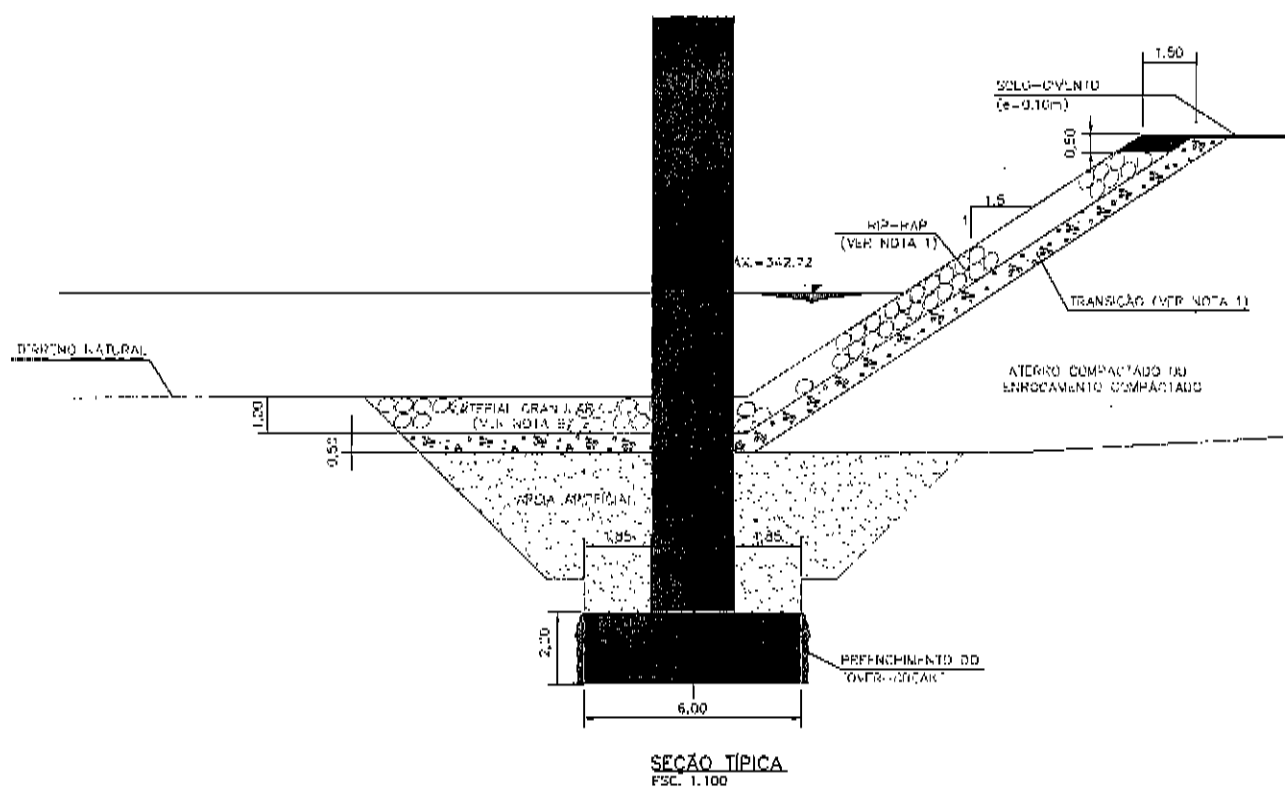

1- NO CASO DE ENROCAMENTO COMPACTADO, AS CAMADAS DE TRANSIÇÃO E DE ROL-ROL SÃO DESNECESSÁRIAS.

SONDOTÉCNICA

0150h
